Cronograma reprogramado · taller hasta el 29 de octubre · obra del 3 al 21 de noviembre

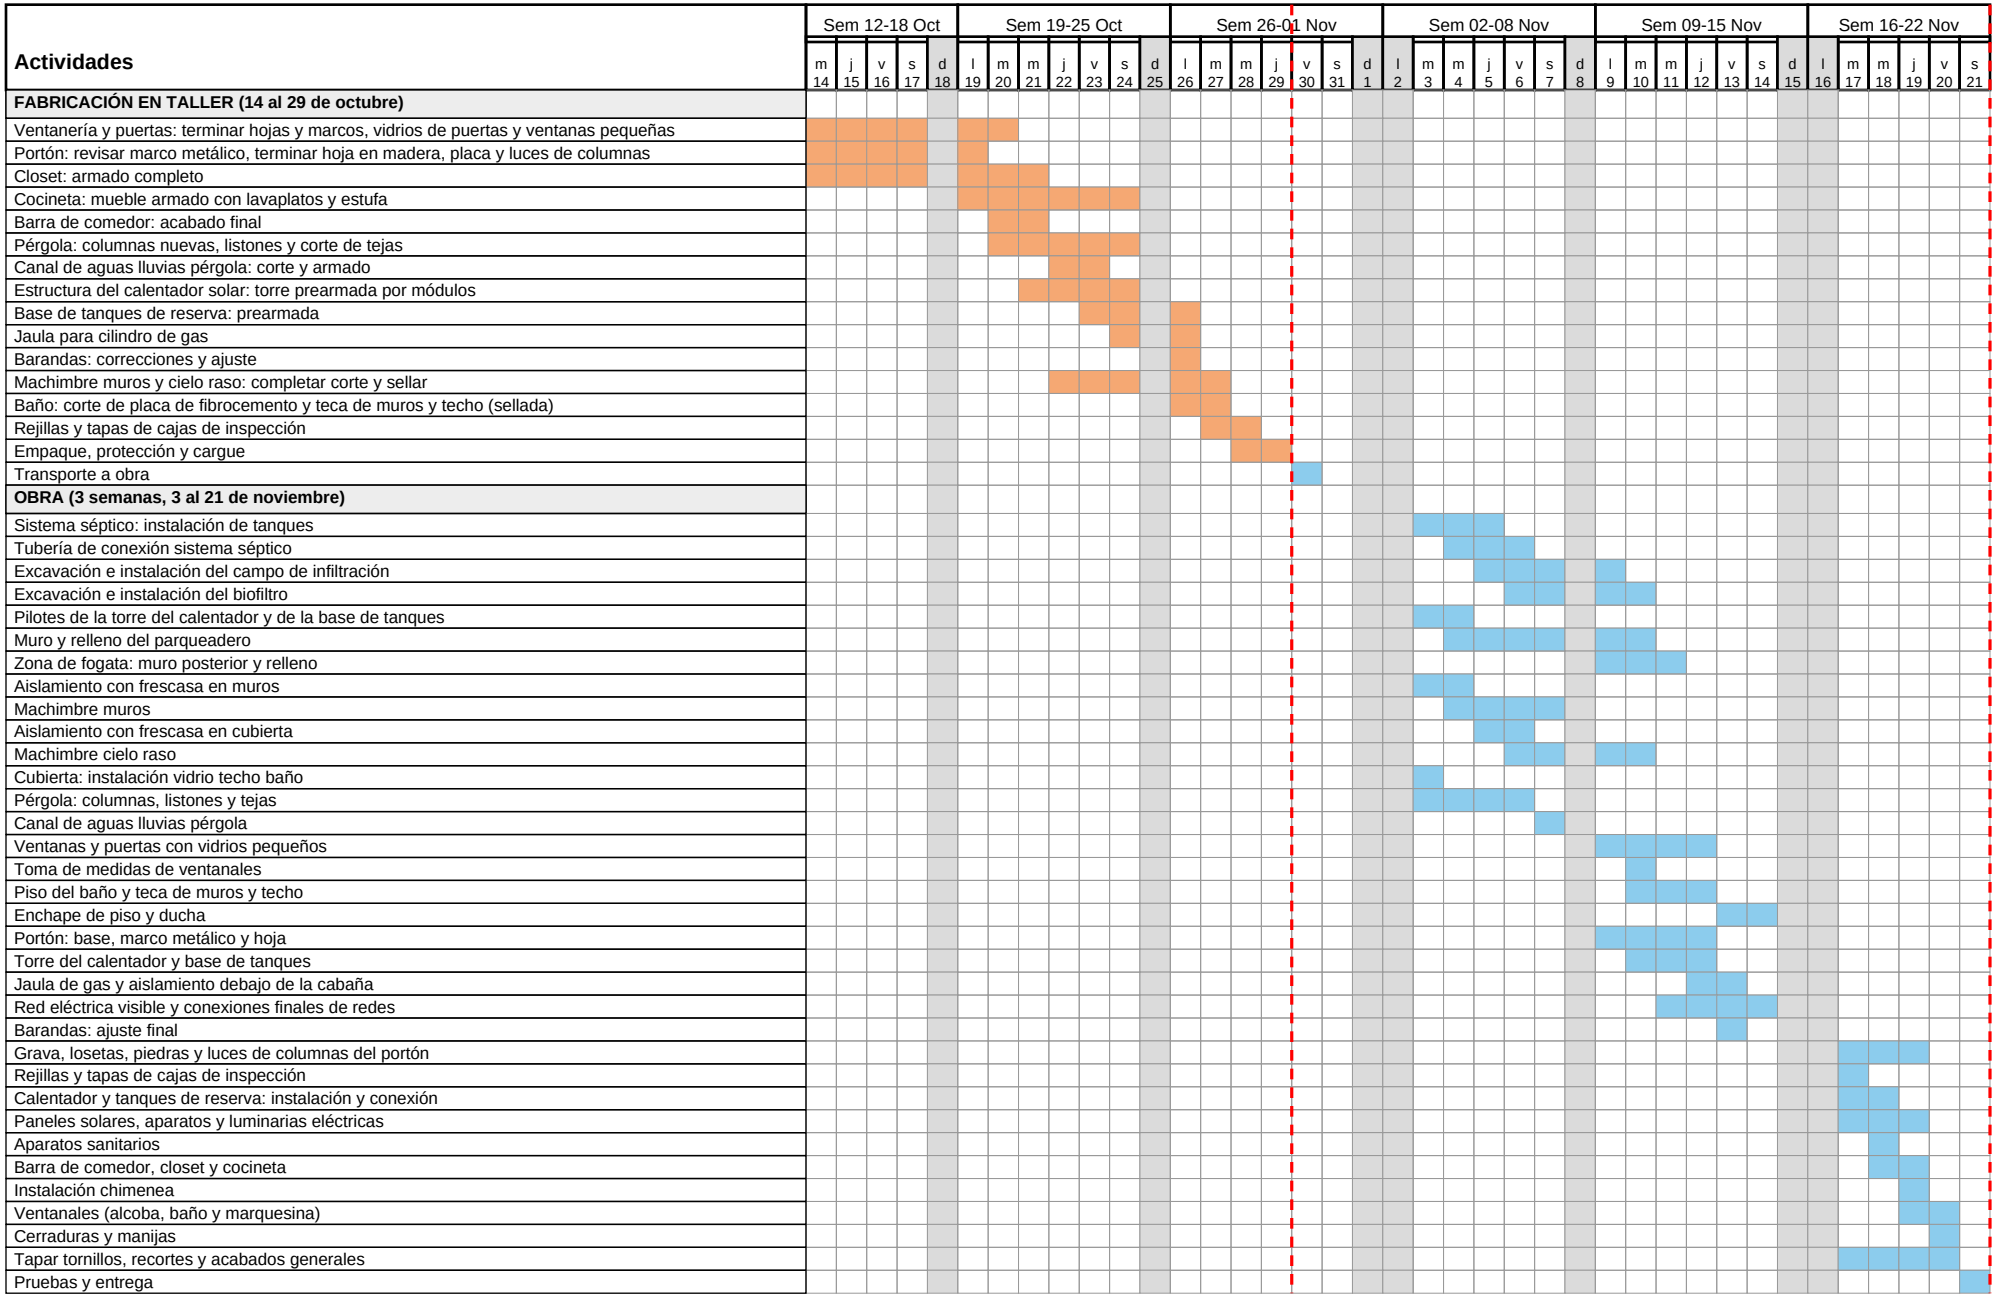

Taller Obra Domingos y festivos (2 y 16 de noviembre)

Lo que no se puede hacer en taller: obras de tierra, concreto y sistema séptico, aislamiento, instalación de machimbre y teca, enchape, conexiones de redes y acabados en sitio.

Ventanales: se miden en obra el 10 de noviembre, una vez instalados marcos y acabados. Para instalarlos el 19 y 20 deben fabricarse en máximo 8 días.

Cerraduras y manijas: el cerrajero va el 20 de noviembre, con todas las puertas y ventanas ya instaladas.
